

Saksframlegg

Saksgang:

Styre	Møtedato
Styret Sykehusinnkjøp HF	30.juni 2016

SAK NR 47-2016

Masterplan v1.0 for etableringsprosjektet

Forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner masterplan v1.0 for etableringsprosjektet.

Oslo, 23.juni, 2016

Steinar Marthinsen
Styreleder

1. Hva saken gjelder

Styret godkjente prosjektdirektivet for etableringsprosjekt 2.mai 2016, sak 027-2016. Direktivet synliggjør pågående arbeidsstrømmer. På styremøtet 30.mai 2016, sak 036-2016 etterspurte styret en helhetlig masterplan for arbeidet, hvor leveranser og avhengigheter fremkommer.

Denne saken presenterer en helhetlig plan for etableringsprosjektet. Det vises, for ordens skyld, også til sak 046-2016 Statusrapportering, hvor status på fremdrift og risiko fremkommer, samlet for prosjektet og pr arbeidsstrøm.

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer

Masterplanen er styrets ledelsesverktøy, hvor formålet er å sikre at prosjektets og arbeidsstrømmenes leveranser bidrar til å sikre en vellykket etablering av Sykehusinnkjøp HF. I tillegg er den et grunnlag for å sikre en helhetlig og effektiv styring, samt være et beslutningsgrunnlag for å prioritering. Videre er masterplanen prosjektkontorets arbeidsverktøy for planlegge, styre og kvalitetssikre leveransene i de ulike arbeidsstrømmene.

Den presenterte masterplanen er en sammenstilling av gjeldende planverk med fokus på 2016. Noen av arbeidsstrømmene har leveranser i 2017. Alle arbeidsstrømmer har detaljerte planer som følges opp av prosjektkontoret og nasjonal prosjektgruppe.

Gjennom arbeidet med denne første versjonen av masterplanen er det identifisert noen forbedringsområder i planverket. Dette er i hovedsak relatert til:


- Ytterligere kvalitetssikring av arbeidsstrømmenes detaljerte planer, og samlet prioritering.
- Det er et behov for ytterligere nivellere milepæler, arbeidspakker og leveranser
- Det er et behov for å sikre at involverte har en felles forståelse av innhold i noen av arbeidspakkene
- Milepæler fra regionale prosjekter vil inkluderes synliggjøres når vedtatte regionale prosjektmandater foreligger.

Nasjonalt prosjektkontor og arbeidsstrømslederne vil jobbe videre med å ytterligere øke kvaliteten i planverket legge frem en oppdatert versjon 1.1 på neste styremøte 24.august 2016.

Den samlede milepælsplanen er presentert på neste side.

F1: Forberede og virksomhetsoverdra HINAS og Sykehuspartner

F2: For. og. v.o. fra regionene

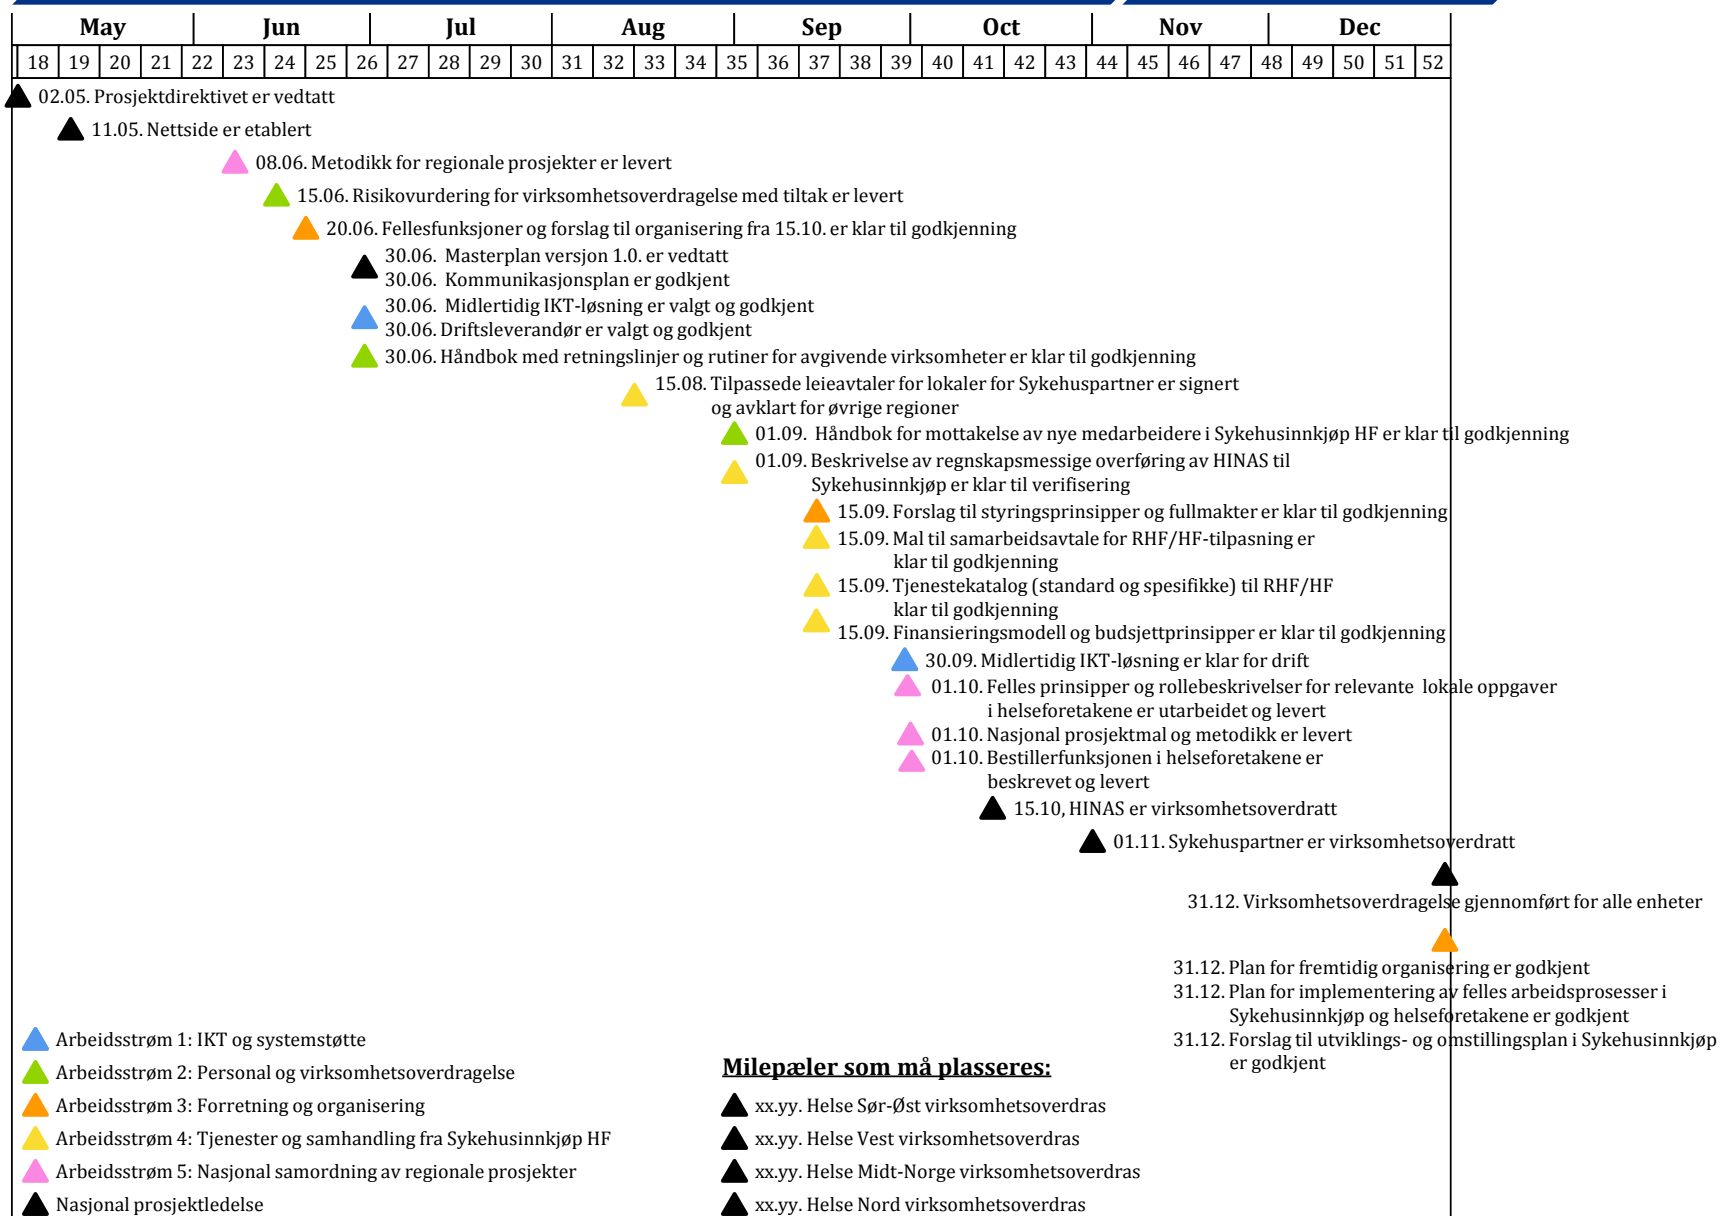

Avhengigheter mellom arbeidsstrømmer og arbeidspakker er kartlagt og følges nå opp i koordineringsmøter.

Prosesen for utarbeidelse av masterplanen har vært som følger:

- Nasjonalt prosjektkontor utarbeidet et utkast til masterplan basert på gjeldende planverk pr 17.juni 2016
- Masterplanen ble gjennomgått med nasjonal prosjektgruppe og arbeidsstrømsledere 20.juni 2016
- Nasjonalt prosjektkontor har utarbeidet endelig masterplan v1.0 etter avklaringsmøter med arbeidsgrupelederne etter prosjektgruppemøtet 20.juni 2016

3. Anbefaling

Det anbefales at styret godkjenner masterplanen v1.0. På hvert styremøte fremover vil det være en rapportering fra prosjektet til styret på fremdrift, risiko, økonomi og evt omfangsendringer.

Trykte vedlegg:

- Masterplan 2016 – v. 1.0

Utrykte vedlegg:

- Ingen
